# DataSprint

## Tableau de bord de suivi des ventes d'une petite boutique

Rapport final · Gestion de Projets Agiles · Master 1 Big Data Analytics (M1 MBDA), UN-CHK
Groupe 1 · Isselmou, Ndeye Sokhna, Ibrahima Gabar Diop · Enseignant : Mama AMAR · Année 2026-2027
Dépôt du projet : https://github.com/Gblack98/datasprint-agile

## 1. Contexte, vision et Sprint Goal

Une petite boutique veut mieux comprendre ses ventes de la semaine et décider rapidement. Notre équipe devait concevoir un tableau de bord qui permet au responsable de consulter les indicateurs essentiels, d'explorer les ventes et de repérer quelques tendances. Le travail tient en un sprint Scrum de cinq jours, du mardi 6 au samedi 10 octobre 2026.

Ce projet ne cherche pas la sophistication technique. Il demande d'organiser le travail, de prioriser la valeur, de collaborer, de suivre l'avancement, d'obtenir du feedback et d'améliorer la façon de travailler.

### Vision

*Permettre au responsable de la boutique de comprendre ses ventes d'un coup d'oeil grâce à un tableau de bord simple.*

### Sprint Goal

En cinq jours, livrer un tableau de bord qui affiche 4 indicateurs, 3 graphiques, 2 filtres et 3 constats tirés des données.

**Utilisateur.** Le responsable de la boutique (une boutique fictive de Dakar, Maison Baobab). **Hors périmètre.** Aucun backend, aucune API, aucune authentification, aucune base de données, aucun déploiement cloud, aucune application mobile. **Choix techniques.** HTML, CSS et JavaScript, avec des données synthétiques dans un fichier CSV.

## 2. Équipe, rôles et règles de fonctionnement

| Rôle Scrum | Membre | Ce qu'il porte |
|---|---|---|
| **Product Owner** | Isselmou | La vision, l'ordre des stories, la validation des stories terminées. |
| **Scrum Master** | Ndeye Sokhna | Les cérémonies, le journal des daily et le burndown, les tests, le fichier de données. |
| **Équipe de réalisation** | Ibrahima Gabar Diop | Le tableau de bord (HTML, CSS, JavaScript), le rapport, le dossier à remettre. |

Le rôle dit qui veille à ce qu'une chose soit faite, pas qui la fait seul : nous travaillons ensemble sur l'ensemble du projet. Les règles sont écrites dans le dépôt et suivies par toute l'équipe.

- **Un board partagé** sur GitHub Projects, avec quatre colonnes : À faire, En cours, À valider, Terminé. Une story ou une tâche est une carte.
- **Un daily de 10 à 15 minutes** : qu'ai-je fait, que vais-je faire, qu'est-ce qui me bloque. Les réponses sont notées dans le journal.

- **Une Definition of Done.** Une story est terminée quand elle répond à ses critères, que les calculs sont vérifiés sur quelques lignes, que le graphique est lisible, qu'un autre membre l'a relue et que le Product Owner l'a acceptée.
- **Des pull requests relues.** Tout ajout au dépôt passe par une pull request relue par un autre membre avant d'être fusionné.

## 3. Product Backlog, priorisation et estimation

Les huit besoins du sujet (B1 à B8) sont devenus huit user stories, écrites sous la forme « En tant que responsable de boutique, je veux… afin de… ». Chacune a deux à trois critères d'acceptation mesurables, une priorité (Must, Should, Could) et une estimation en story points. Les points sont relatifs, sur une suite de Fibonacci : ils comparent la taille des stories, ils ne promettent pas une durée.

| ID | User story (résumé) | Prio. | Pts | Critères d'acceptation principaux |
|---|---|---|---|---|
| US01 | Voir le chiffre d'affaires et le nombre de commandes | Must | 3 | CA = somme de quantité x prix ; valeurs visibles sans clic ; vérifiées sur un échantillon. |
| US02 | Voir la quantité vendue et le panier moyen | Must | 2 | Panier moyen = CA / commandes ; vérifié sur un échantillon. |
| US03 | Suivre l'évolution des ventes par date | Must | 5 | Graphique lisible, dates ordonnées ; la somme des points égale le CA total. |
| US04 | Comparer les ventes par catégorie | Must | 3 | Classement trié ; la somme des catégories égale le CA total. |
| US05 | Identifier les produits les plus vendus | Should | 3 | Top 5 affiché, critère de tri indiqué. |
| US06 | Filtrer le tableau de bord | Should | 5 | Filtres période et catégorie, appliqués à tout ; retour à la vue complète. |
| US07 | Comparer par canal ou par zone | Could | 3 | Vue comparative simple, cohérente avec le total. |
| US08 | Disposer de trois constats rédigés | Must | 3 | Une phrase chacun, justifiée par une donnée visible, validée par le PO. |

Le total est de 27 points : 16 en Must, 8 en Should, 3 en Could. Les trois visualisations et les deux filtres demandés par le sujet sont dans l'incrément minimum, donc US05 et US06 sont engagées malgré leur priorité Should. US07 (Could) reste hors du sprint, à prendre si la capacité le permet. Le Sprint Planning du jour 1 a retenu 7 stories pour 24 points.

## 4. Sprint Backlog et suivi de l'avancement

Le sprint est découpé en 22 tâches : une partie rattachée aux 7 stories engagées, le reste pour les cérémonies et les livrables. Chacune a un jour, une priorité et un responsable sur le board. Le détail, avec les numéros des issues, est dans le fichier du Sprint Backlog du dépôt.

| Jour | Travail prévu |
|---|---|
| **J1, mar. 6 oct.** | Sprint Planning, validation de la vision et de l'ordre des stories, fichier de données. |
| **J2, mer. 7 oct.** | Page de base et lecture du CSV, indicateurs des stories US01 et US02, vérification sur un échantillon, journal. |
| **J3, jeu. 8 oct.** | Graphiques par date et par catégorie, Top 5, filtres par période et par catégorie, mise en forme. |
| **J4, ven. 9 oct.** | Tests des stories, trois constats, support de démonstration, US07 si la capacité le permet. |
| **J5, sam. 10 oct.** | Sprint Review, rétrospective, rapport final, remise du dossier. |

### Burndown

Les points restants sont mis à jour chaque soir. Une story ne baisse le compteur qu'une fois terminée au sens de la Definition of Done, c'est pourquoi la courbe reste à 24 au jour 2. Au jour 3, US01 et US02 (5 points) sont terminées. Au jour 4, les cinq autres stories engagées (19 points) sont terminées et acceptées par le Product Owner : le compteur tombe à 0, un jour avant la fin du sprint.

| Jour | Points restants | Points idéaux |
|---|---|---|
| J1 | 24 | 24 |
| J2 | 24 | 19 |
| J3 | 19 | 14 |
| J4 | 0 | 10 |
| J5 | 0 | 0 |

### Obstacles

- Le Product Owner n'avait pas encore accepté l'invitation au dépôt GitHub (signalé au jour 2, résolu au jour 4 : il a accès au dépôt et au board). Un guide pas à pas lui a été écrit pour valider les stories depuis le board.

## 5. L'incrément livré et ses résultats

Le tableau de bord s'ouvre dans un navigateur, sans compte ni base de données (un petit serveur local suffit pour lire le fichier). Il lit un fichier CSV de 289 commandes synthétiques sur quatre semaines (du 7 septembre au 4 octobre 2026). Une ligne du fichier est une commande.

- **4 indicateurs :** chiffre d'affaires, commandes, quantité vendue, panier moyen, avec l'évolution par rapport à la semaine précédente.
- **5 graphiques :** évolution des ventes par date, ventes par catégorie, Top 5 des produits, ventes par jour de la semaine, canal et zone.
- **3 filtres :** période (semaine ou toute la période), catégorie, canal. Ils s'appliquent à tout le tableau de bord.
- **3 constats** écrits à partir des chiffres affichés, et un tableau jumeau pour chaque graphique.




*Figure 1. Le tableau de bord sur les quatre semaines.*

### Résultats

| Indicateur | 4 semaines | Semaine 4 | Semaine 3 |
|---|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | 4 066 000 FCFA | 898 500 FCFA | 1 248 500 FCFA |
| **Commandes** | 289 | 68 | 78 |
| **Quantité vendue** | 522 | 106 | 133 |
| **Panier moyen** | 14 069 FCFA | 13 213 FCFA | 16 006 FCFA |

La semaine 4 recule de 28 % en chiffre d'affaires par rapport à la semaine 3. Les trois constats affichés sur la période complète sont :

- Le samedi est le meilleur jour de la semaine : 28 % du chiffre d'affaires sur quatre semaines.
- L'Électronique fait 36 % du chiffre d'affaires, devant la Beauté (28 %).
- Le canal Boutique porte 55 % des ventes, et Dakar concentre 63 % du chiffre d'affaires.

### Qualité et choix techniques

- Les valeurs ont été recalculées séparément sur le fichier CSV (chiffre d'affaires, commandes, quantités, panier moyen, jour fort, parts par catégorie). Elles sont identiques à l'affichage.
- Le tableau de bord tient dans un seul écran d'ordinateur et s'adapte aux tablettes et aux téléphones, de 320 à 2560 pixels de large.
- Les couleurs sont limitées à trois teintes (indigo, safran, rose), avec des contrastes vérifiés pour que les graphiques restent lisibles.
- Les bibliothèques de graphiques et de lecture du CSV sont copiées dans le dépôt : la démonstration marche hors ligne.

Le Sprint Goal est atteint et dépassé : le tableau de bord compte 5 graphiques et 3 filtres, là où le sujet en demandait 3 et 2.

## 6. Sprint Review : feedbacks et stories acceptées ou non

Prévue au jour 5, la Sprint Review s'est tenue en visio le vendredi 9 octobre (jour 4), une fois les stories terminées. Ibrahima a présenté la démonstration du tableau de bord avec le support de cinq slides, puis le Product Owner a décidé pour chaque story, selon ses critères d'acceptation et la Definition of Done.

| Story | Pts | Décision du Product Owner | Retour |
|---|---|---|---|
| US01 | 3 | Acceptée | Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #1 le 10/10. |
| US02 | 2 | Acceptée | Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #2 le 10/10. |
| US03 | 5 | Acceptée | Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #3 le 09/10. |
| US04 | 3 | Acceptée | Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #4 le 09/10. |
| US05 | 3 | Acceptée | Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #5 le 09/10. |
| US06 | 5 | Acceptée | Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #6 le 09/10. |
| US07 | 3 | Acceptée | Hors engagement, prise au jour 4. Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #7 le 09/10. |
| US08 | 3 | Acceptée | Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #8 le 09/10. |

**Feedbacks reçus :** aucune demande de changement, les huit stories ont été acceptées en l'état. Le Product Owner a confirmé chaque acceptation par écrit sur le ticket de la story (« En tant que PO, je valide »).

**Bilan :** 27 points acceptés, soit les 24 points engagés et les 3 points de US07 (Could), que le Sprint Planning prévoyait de prendre au jour 4 s'il restait de la capacité. Aucune story n'est refusée ni reportée.

## 7. Rétrospective : leçons apprises et amélioration prioritaire

La rétrospective s'est tenue le samedi 10 octobre (jour 5), en visio, animée par la Scrum Master, avec les trois membres de l'équipe. La fiche complète est dans le dépôt (docs/07-retrospective).


- **Ce qui a bien marché :** les relectures de pull requests ont permis de corriger des erreurs avant la fusion ; les calculs ont été vérifiés par une autre personne que celle qui les avait écrits, et les chiffres sont les mêmes dans le CSV, le tableau de bord, les slides et le rapport ; toutes les stories ont été acceptées par le Product Owner à la Sprint Review, sans demande de changement.
- **Ce qui a moins bien marché :** le dépôt a été créé au jour 3, donc le travail des jours 1 et 2 n'y apparaît pas ; le Product Owner n'a rejoint le dépôt qu'au jour 4 ; quelques changements ont été poussés directement sur main, sans relecture (GitHub ne propose pas la protection de branche sur un dépôt privé gratuit, la règle « relu avant fusion » repose donc sur la discipline de l'équipe) ; le fichier de données est passé de 178 à 289 commandes en cours de sprint ; beaucoup de travail s'est concentré sur les deux derniers jours.

| Start (à commencer) | Stop (à arrêter) | Continue (à conserver) |
|---|---|---|
| Créer le dépôt et le board dès le J1 | Pousser directement sur main | Relire chaque PR avant fusion |
| Noter le daily le jour même | Changer le fichier de données en cours de sprint | Vérifier les chiffres sur le CSV |


**Action d'amélioration retenue :** créer le dépôt et le board dès le Sprint Planning, et noter le daily le jour même. Responsable : Ndeye Sokhna (Scrum Master).

# Annexes

## Annexe A. Board au début et à la fin du sprint

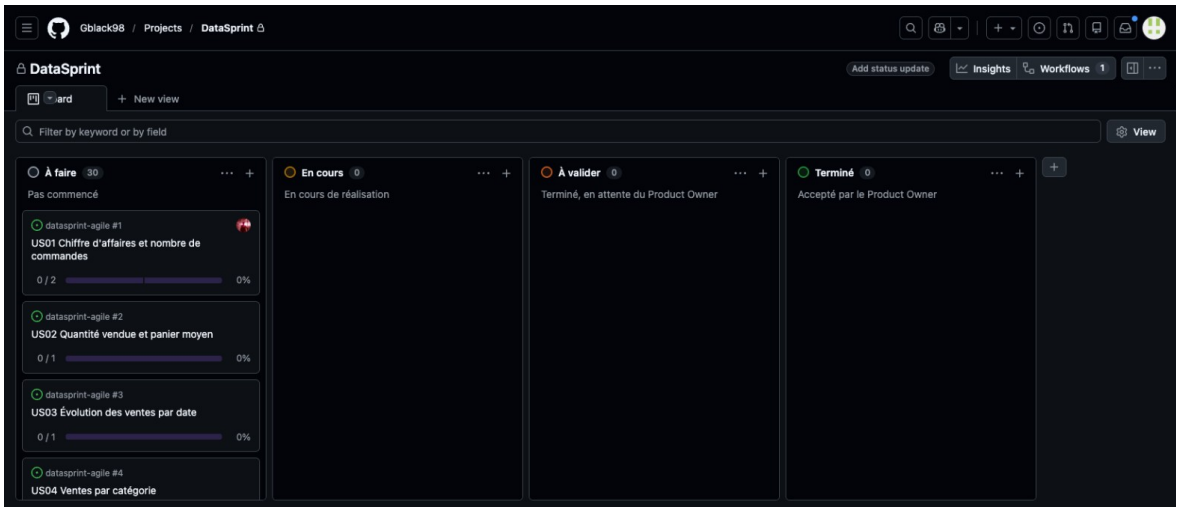


*Début du sprint : les 30 cartes sont dans la colonne À faire.*

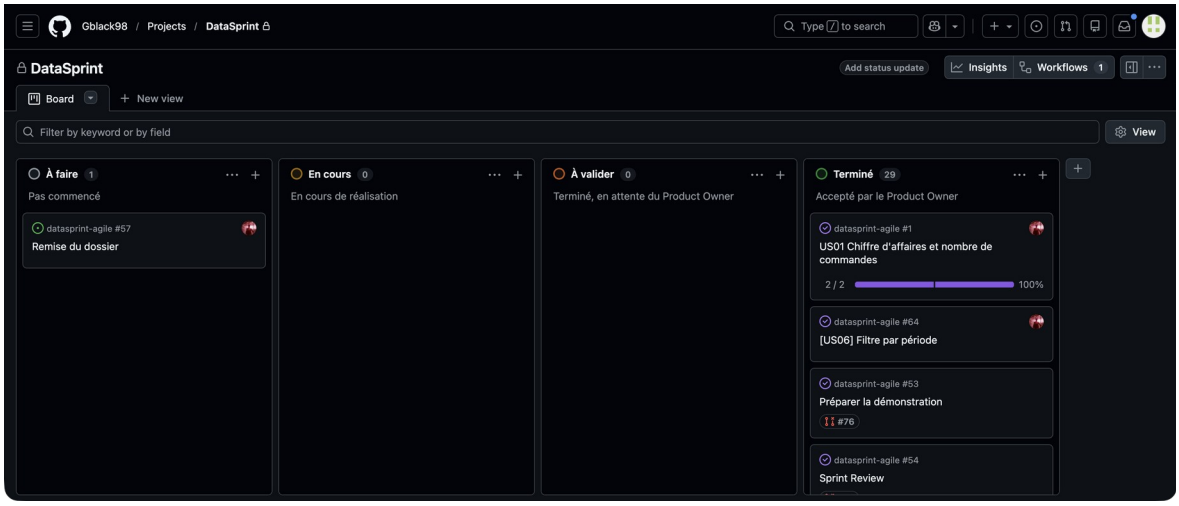


*Fin du sprint : 29 cartes sont dans la colonne Terminé, il reste la remise du dossier.*

## Annexe B. Journal des daily

| Jour | Membre | Fait depuis hier | Prévu aujourd'hui | Obstacle |
|---|---|---|---|---|
| J2 – mer. 07/10 | Ibrahima | Création du board et des cartes du sprint | Page HTML et lecture du CSV (#49), chiffre d'affaires et commandes (#58), quantité et panier moyen (#60) | Aucun |
| J2 – mer. 07/10 | Isselmou | Validation de la vision, du Sprint Goal et de l'ordre des stories (#46) | Rejoindre le dépôt et le board | Invitation au dépôt pas encore acceptée |
| J2 – mer. 07/10 | Ndeye Sokhna | Animation du Sprint Planning (#47), fichier CSV des ventes (#48) | Valeurs de contrôle de US01 (#59), journal et burndown (#50) | Aucun |
| J3 – jeu. 08/10 | Ibrahima | Page de base, lecture du CSV, indicateurs US01 et US02 | Graphique par date (#61), Top 5 (#63), filtre par période (#64) | Aucun |
| J3 – jeu. 08/10 | Isselmou | Guide du board reçu | Mise en forme du tableau de bord (#51) | Accès au dépôt en cours |
| J3 – jeu. 08/10 | Ndeye Sokhna | Valeurs de contrôle calculées : CA 4 066 000 FCFA, 289 commandes, panier moyen 14 069 FCFA | Graphique par catégorie (#62), filtre par catégorie (#65) | Aucun |
| J4 – ven. 09/10 | Ibrahima | Graphique par date, Top 5, filtre par période | Corrections après les tests, préparation du rapport (#56) | Aucun |
| J4 – ven. 09/10 | Isselmou | Mise en forme du tableau de bord | Trois constats (#67), démonstration (#53) | Aucun |
| J4 – ven. 09/10 | Ndeye Sokhna | Graphique par catégorie, filtre par catégorie | Tests des stories (#52), US07 si le temps le permet (#66) | Aucun |
| J5 – sam. 10/10 | Ibrahima | Démo de l'incrément en Sprint Review (visio) | Rapport final (#56), remise (#57) | Aucun |
| J5 – sam. 10/10 | Isselmou | Sprint Review : toutes les stories acceptées | Compte rendu de la review (#54), rétrospective | Aucun |
| J5 – sam. 10/10 | Ndeye Sokhna | Sprint Review, relecture de #73 et #74 | Rétrospective (#55) | Aucun |
