DataSprint

Tableau de bord de suivi des ventes d'une petite boutique

Rapport final · Gestion de Projets Agiles · Master 1 Big Data Analytics (M1 MBDA), UN-CHK
Groupe 1 · Isselmou Sidi OUMOU, Ndeye Sokhna NOKHO, Ibrahima Gabar DIOP
Enseignant : Mama AMAR · Année 2024-2025

Dépôt du projet : https://github.com/Gblack98/datasprint-agile
Tableau de bord en ligne (copie de consultation, après le sprint) : https://datasprint-agile.vercel.app

1. Contexte, vision et Sprint Goal

Une petite boutique veut mieux comprendre ses ventes de la semaine et décider rapidement. Notre équipe devait concevoir un tableau de bord qui permet au responsable de consulter les indicateurs essentiels, d'explorer les ventes et de repérer quelques tendances. Le travail tient en un sprint Scrum de cinq jours, du mardi 6 au samedi 10 octobre 2026.

Ce projet ne cherche pas la sophistication technique. Il demande d'organiser le travail, de prioriser la valeur, de collaborer, de suivre l'avancement, d'obtenir du feedback et d'améliorer la façon de travailler.

Vision

Permettre au responsable de la boutique de comprendre ses ventes d'un coup d'oeil grâce à un tableau de bord simple.

Sprint Goal

En cinq jours, livrer un tableau de bord qui affiche 4 indicateurs, 3 graphiques, 2 filtres et 3 constats tirés des données.

Utilisateur. Le responsable de la boutique (une boutique fictive de Dakar, Maison Baobab). **Hors périmètre.** Aucun backend, aucune API, aucune authentification, aucune base de données, aucun déploiement cloud, aucune application mobile. **Choix techniques.** HTML, CSS et JavaScript, avec des données synthétiques dans un fichier CSV.

2. Équipe, rôles et règles de fonctionnement

Rôle Scrum	Membre	Ce qu'il porte
Product Owner	Isselmou Sidi OUMOU	La vision, l'ordre des stories, la validation des stories terminées.
Scrum Master	Ndeye Sokhna NOKHO	Les cérémonies, le journal des daily et le burndown, les tests, le fichier de données.
Équipe de réalisation	Ibrahima Gabar DIOP	Le tableau de bord (HTML, CSS, JavaScript), le rapport, le dossier à remettre.

Le rôle dit qui veille à ce qu'une chose soit faite, pas qui la fait seul : nous travaillons ensemble sur l'ensemble du projet. Les règles sont écrites dans le dépôt.

- **Un board partagé** sur GitHub Projects, avec quatre colonnes : À faire, En cours, À valider, Terminé. Une story ou une tâche est une carte.
- **Un daily de 10 à 15 minutes** : qu'ai-je fait, que vais-je faire, qu'est-ce qui me bloque. Les réponses sont notées dans le journal.

- **Une Definition of Done.** Une story est terminée quand elle répond à ses critères, que les calculs sont vérifiés sur quelques lignes, que le graphique est lisible, qu'un autre membre l'a relue et que le Product Owner l'a acceptée.
- **Des pull requests relues.** La règle : tout ajout au dépôt passe par une pull request relue par un autre membre avant d'être fusionné. Pendant le sprint, 7 des 9 pull requests fusionnées ont été relues ; celles du tableau de bord (#71) et de la rétrospective (#78) ne l'ont pas été.

3. Product Backlog, priorisation et estimation

Les huit besoins du sujet (B1 à B8) sont devenus huit user stories, écrites sous la forme « En tant que responsable de boutique, je veux… afin de… ». Chacune a deux à trois critères d'acceptation mesurables, une priorité (Must, Should, Could) et une estimation en story points. Les points sont relatifs, sur une suite de Fibonacci : ils comparent la taille des stories, ils ne promettent pas une durée.

ID	User story (résumé)	Prio.	Pts	Critères d'acceptation principaux
US01	Voir le chiffre d'affaires et le nombre de commandes	Must	3	CA = somme de quantité x prix ; valeurs visibles sans clic ; vérifiées sur un échantillon.
US02	Voir la quantité vendue et le panier moyen	Must	2	Panier moyen = CA / commandes ; vérifié sur un échantillon.
US03	Suivre l'évolution des ventes par date	Must	5	Graphique lisible, dates ordonnées ; la somme des points égale le CA total.
US04	Comparer les ventes par catégorie	Must	3	Classement trié ; la somme des catégories égale le CA total.
US05	Identifier les produits les plus vendus	Should	3	Top 5 affiché, critère de tri indiqué.
US06	Filtrer le tableau de bord	Should	5	Filtres période et catégorie, appliqués à tout ; retour à la vue complète.
US07	Comparer par canal ou par zone	Could	3	Vue comparative simple, cohérente avec le total.
US08	Disposer de trois constats rédigés	Must	3	Une phrase chacun, justifiée par une donnée visible, validée par le PO.

Le total est de 27 points : 16 en Must, 8 en Should, 3 en Could. Les trois visualisations et les deux filtres demandés par le sujet sont dans l'incrément minimum, donc US05 et US06 sont engagées malgré leur priorité Should. US07 (Could) reste hors du sprint, à prendre si la capacité le permet. Le Sprint Planning du jour 1 a retenu 7 stories pour 24 points.

4. Sprint Backlog et suivi de l'avancement

Le sprint est découpé en 22 tâches : une partie rattachée aux 7 stories engagées, le reste pour les cérémonies et les livrables. Chacune a un jour, une priorité et un responsable sur le board. Le détail, avec les numéros des issues, est dans le fichier du Sprint Backlog du dépôt.

Jour	Travail prévu
J1, mar. 6 oct.	Sprint Planning, validation de la vision et de l'ordre des stories, fichier de données.
J2, mer. 7 oct.	Page de base et lecture du CSV, indicateurs des stories US01 et US02, vérification sur un échantillon, journal.
J3, jeu. 8 oct.	Graphiques par date et par catégorie, Top 5, filtres par période et par catégorie, mise en forme.
J4, ven. 9 oct.	Tests des stories, trois constats, support de démonstration, US07 si la capacité le permet.
J5, sam. 10 oct.	Sprint Review, rétrospective, rapport final, remise du dossier.

Burndown

Les points restants sont mis à jour chaque soir. Une story ne baisse le compteur qu'une fois terminée au sens de la Definition of Done, c'est pourquoi la courbe reste à 24 au jour 2. Au jour 3, US01 et US02 (5 points) sont terminées. Au jour 4, les cinq autres stories engagées (19 points) sont terminées et acceptées par le Product Owner : le compteur tombe à 0, un jour avant la fin du sprint.

Jour	Points restants	Points idéaux
J1	24	24
J2	24	19
J3	19	14
J4	0	10
J5	0	0

Obstacles

- Le Product Owner n'avait pas encore accepté l'invitation au dépôt GitHub (signalé au jour 2, résolu au jour 4 : il a accès au dépôt et au board). Un guide pas à pas lui a été écrit pour valider les stories depuis le board.

5. L'incrément livré et ses résultats

Le tableau de bord s'ouvre dans un navigateur, sans compte ni base de données (un petit serveur local suffit pour lire le fichier). Il lit un fichier CSV de 289 commandes synthétiques sur quatre semaines (du 7 septembre au 4 octobre 2026). Une ligne du fichier est une commande.

- **4 indicateurs :** chiffre d'affaires, commandes, quantité vendue, panier moyen, avec l'évolution par rapport à la semaine précédente.
- **5 graphiques :** évolution des ventes par date, ventes par catégorie, Top 5 des produits, ventes par jour de la semaine, canal et zone.
- **3 filtres :** période (semaine ou toute la période), catégorie, canal. Ils s'appliquent à tout le tableau de bord.
- **3 constats** écrits à partir des chiffres affichés, et un tableau jumeau pour chaque graphique.



Figure 1. Le tableau de bord sur les quatre semaines.

Résultats

Indicateur	4 semaines	Semaine 4	Semaine 3
Chiffre d'affaires	4 066 000 FCFA	898 500 FCFA	1 248 500 FCFA
Commandes	289	68	78
Quantité vendue	522	106	133
Panier moyen	14 069 FCFA	13 213 FCFA	16 006 FCFA

La semaine 4 recule de 28 % en chiffre d'affaires par rapport à la semaine 3. Les trois constats affichés sur la période complète sont :

- Le samedi est le meilleur jour de la semaine : 28 % du chiffre d'affaires sur quatre semaines.
- L'Électronique fait 36 % du chiffre d'affaires, devant la Beauté (28 %).
- Le canal Boutique porte 55 % des ventes, et Dakar concentre 63 % du chiffre d'affaires.

Qualité et choix techniques

- Les valeurs ont été recalculées séparément sur le fichier CSV (chiffre d'affaires, commandes, quantités, panier moyen, jour fort, parts par catégorie). Elles sont identiques à l'affichage.
- Le tableau de bord tient dans un seul écran d'ordinateur et s'adapte aux tablettes et aux téléphones, de 320 à 2560 pixels de large.
- Les couleurs sont limitées à trois teintes (indigo, safran, rose), avec des contrastes vérifiés pour que les graphiques restent lisibles.
- Les bibliothèques de graphiques et de lecture du CSV sont copiées dans le dépôt : la démonstration marche hors ligne.

Le Sprint Goal est atteint et dépassé : le tableau de bord compte 5 graphiques et 3 filtres, là où le sujet en demandait 3 et 2.

6. Sprint Review : feedbacks et stories acceptées ou non

Prévue au jour 5, la Sprint Review s'est tenue en visio le vendredi 9 octobre (jour 4), une fois les stories terminées. Ibrahima a présenté la démonstration du tableau de bord avec le support de cinq slides, puis le Product Owner a décidé pour chaque story, selon ses critères d'acceptation et la Definition of Done.

Story	Pts	Décision du Product Owner	Retour
US01	3	Acceptée	Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #1 le 10/10.
US02	2	Acceptée	Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #2 le 10/10.
US03	5	Acceptée	Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #3 le 09/10.
US04	3	Acceptée	Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #4 le 09/10.
US05	3	Acceptée	Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #5 le 09/10.
US06	5	Acceptée	Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #6 le 09/10.
US07	3	Acceptée	Hors engagement, prise au jour 4. Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #7 le 09/10.
US08	3	Acceptée	Aucun changement demandé. Confirmée par écrit sur le ticket #8 le 09/10.

Feedbacks reçus : aucune demande de changement, les huit stories ont été acceptées en l'état. Le Product Owner a confirmé chaque acceptation par écrit sur le ticket de la story (« En tant que PO, je valide »).

Bilan : 27 points acceptés, soit les 24 points engagés et les 3 points de US07 (Could), que le Sprint Planning prévoyait de prendre au jour 4 s'il restait de la capacité. Aucune story n'est refusée ni reportée.

7. Rétrospective : leçons apprises et amélioration prioritaire

La rétrospective s'est tenue le samedi 10 octobre (jour 5), en visio, animée par la Scrum Master, avec les trois membres de l'équipe. La fiche complète est dans le dépôt (docs/07-retrospective).


- **Ce qui a bien marché :** les relectures de pull requests ont permis de corriger des erreurs avant la fusion ; les calculs ont été vérifiés par une autre personne que celle qui les avait écrits, et les chiffres sont les mêmes dans le CSV, le tableau de bord, les slides et le rapport ; toutes les stories ont été acceptées par le Product Owner à la Sprint Review, sans demande de changement.
- **Ce qui a moins bien marché :** le dépôt a été créé au jour 3, donc le travail des jours 1 et 2 n'y apparaît pas ; le Product Owner n'a rejoint le dépôt qu'au jour 4 ; quelques changements ont été poussés directement sur main, sans relecture (GitHub ne propose pas la protection de branche sur un dépôt privé gratuit, la règle « relu avant fusion » repose donc sur la discipline de l'équipe) ; le fichier de données est passé de 178 à 289 commandes en cours de sprint ; beaucoup de travail s'est concentré sur les deux derniers jours.

Start (à commencer)	Stop (à arrêter)	Continue (à conserver)
Créer le dépôt et le board dès le J1	Pousser directement sur main	Relire chaque PR avant fusion
Noter le daily le jour même	Changer le fichier de données en cours de sprint	Vérifier les chiffres sur le CSV


Action d'amélioration retenue : créer le dépôt et le board dès le Sprint Planning, et noter le daily le jour même. Responsable : Ndeye Sokhna (Scrum Master).

Annexes

Annexe A. Board au début et à la fin du sprint

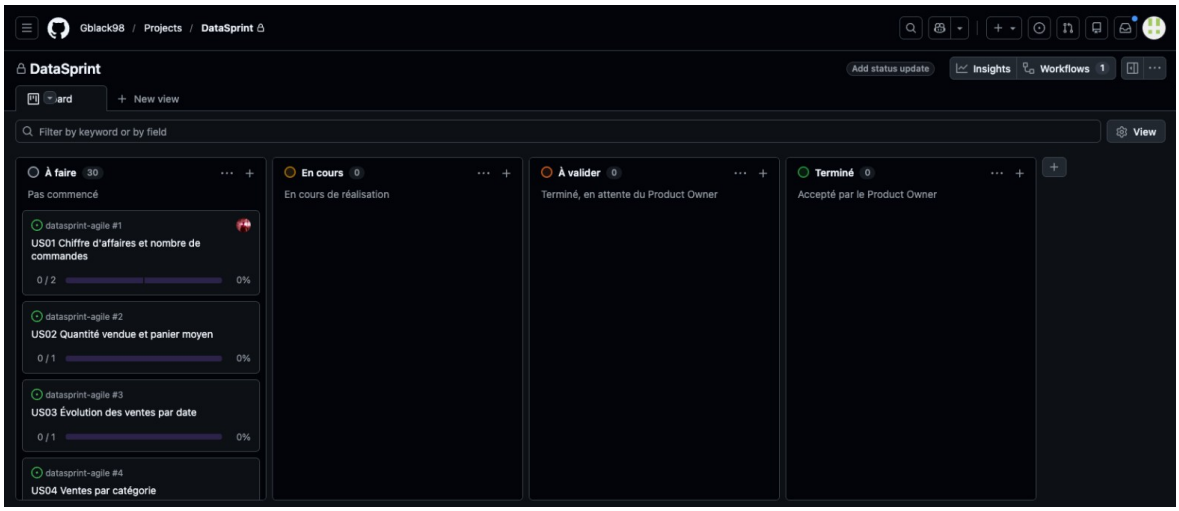

Début du sprint : les 30 cartes sont dans la colonne À faire.

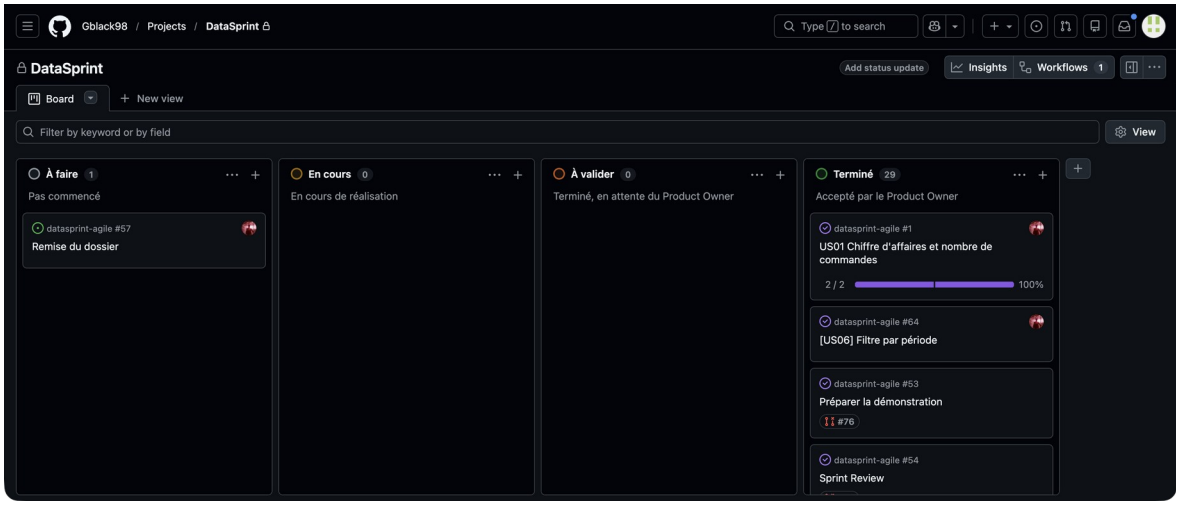

Fin du sprint : 29 cartes sont dans la colonne Terminé, il reste la remise du dossier.

Annexe B. Journal des daily

Jour	Membre	Fait depuis hier	Prévu aujourd'hui	Obstacle
J2 – mer. 07/10	Ibrahima	Création du board et des cartes du sprint	Page HTML et lecture du CSV (#49), chiffre d'affaires et commandes (#58), quantité et panier moyen (#60)	Aucun
J2 – mer. 07/10	Isselmou	Validation de la vision, du Sprint Goal et de l'ordre des stories (#46)	Rejoindre le dépôt et le board	Invitation au dépôt pas encore acceptée
J2 – mer. 07/10	Ndeye Sokhna	Animation du Sprint Planning (#47), fichier CSV des ventes (#48)	Valeurs de contrôle de US01 (#59), journal et burndown (#50)	Aucun
J3 – jeu. 08/10	Ibrahima	Page de base, lecture du CSV, indicateurs US01 et US02	Graphique par date (#61), Top 5 (#63), filtre par période (#64)	Aucun
J3 – jeu. 08/10	Isselmou	Guide du board reçu	Mise en forme du tableau de bord (#51)	Accès au dépôt en cours
J3 – jeu. 08/10	Ndeye Sokhna	Valeurs de contrôle calculées : CA 2 431 000 FCFA, 178 commandes, panier moyen 13 657 FCFA	Graphique par catégorie (#62), filtre par catégorie (#65)	Aucun
J4 – ven. 09/10	Ibrahima	Graphique par date, Top 5, filtre par période	Corrections après les tests, préparation du rapport (#56)	Aucun
J4 – ven. 09/10	Isselmou	Mise en forme du tableau de bord	Trois constats (#67), démonstration (#53)	Aucun
J4 – ven. 09/10	Ndeye Sokhna	Graphique par catégorie, filtre par catégorie	Tests des stories (#52), US07 si le temps le permet (#66)	Aucun
J5 – sam. 10/10	Ibrahima	Démo de l'incrément en Sprint Review (visio)	Rapport final (#56), remise (#57)	Aucun
J5 – sam. 10/10	Isselmou	Sprint Review : toutes les stories acceptées	Compte rendu de la review (#54), rétrospective	Aucun
J5 – sam. 10/10	Ndeye Sokhna	Sprint Review, relecture de #73 et #74	Rétrospective (#55)	Aucun

Note : les valeurs de contrôle du J3 portent sur le premier fichier de ventes (178 commandes). Le fichier est passé à 289 commandes le J4 et les valeurs ont été recalculées ce jour-là : CA 4 066 000 FCFA, 289 commandes, panier moyen 14 069 FCFA (PR #72).
